Behörden- und Gesundheitszentrum Leutkirch Brandschutzmaßnahmen

IKP Ravensburg

Zeile-Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Gewerk
1	**Planung u. Ausschreibung Brandsch.**	**06.02.2017**	**40t**	**31.03.2017**	
2	Ausschr. an Bauherr	06.02.2017		06.02.2017	J+G
3	Veröffentlichung Ausschr.	13.02.2017		13.02.2017	Bauherr
4	Submission	27.02.2017		27.02.2017	Bauherr
5	Prüfung u. Wertung	27.02.2017	10t	10.03.2017	J+G
6	Vergabegespräche	13.03.2017	10t	24.03.2017	Bauherr
7	Vergabe Aussschr. Brandsch.	27.03.2017	5t	31.03.2017	Bauherr
8	**UG-4.OG Brandschutztüren**	**08.05.2017**	**67t**	**11.08.2017**	
9	Vorlage Werkplanung	08.05.2017		08.05.2017	Metallbauarbeiten T30
10	Prüfung u. Freigabe Werkplanung	08.05.2017	10t	19.05.2017	J+G
11	UG-4.OG Einbau T30-Türen	17.07.2017	10t	28.07.2017	Metallbauarbeiten T30
12	UG-4. OG Malerarbeiten	31.07.2017	10t	11.08.2017	Malerarbeiten
13	**1. OG**	**20.02.2017**	**15t**	**10.03.2017**	
14	BMA ELT 1. OG (in Umbaumaßnahmen 1. OG enthalten)	20.02.2017	10t	03.03.2017	TGA Elektro
15	Decken schließen 1. OG, 7 St 30x30, Revi 1 St	06.03.2017	5t	10.03.2017	Trockenbau
16	**UG**	**13.03.2017**	**28t**	**21.04.2017**	
17	UG Decken öffnen UG 16 St 30x30, Rvikl. 10 St 4x40	13.03.2017	10t	24.03.2017	Trockenbau
18	UG Leitungsverlegung BMA ELT	27.03.2017	5t	31.03.2017	TGA Elektro
19	UG Montage Rauchmelder ink. Inbetriebnahme	03.04.2017	4t	06.04.2017	TGA Elektro
20	UG BMA F30-Einhausung	03.04.2017	5t	07.04.2017	Trockenbau
21	UG Decken schließen, 16 St 30x30, Revi 10 St	10.04.2017	4t	13.04.2017	Trockenbau
22	UG Maler Decken	18.04.2017	4t	21.04.2017	Malerarbeiten
23	**EG**	**24.04.2017**	**32t**	**09.06.2017**	
24	EG Decken öffnen EG, 11 St 30x30, Revi 8 St 40x40, Revi-F30 8 St 40x40	24.04.2017	9t	05.05.2017	Trockenbau
25	EG Leitungsverlegung BMA ELT	08.05.2017	5t	12.05.2017	TGA Elektro
26	EG Montage Rauchmelder inkl. Inbetriebnahme	15.05.2017	5t	19.05.2017	TGA Elektro
27	EG Decken schließen EG, 11 St 30x30, Revi 8 St 40x40, Revi F30 8 St 40x40	22.05.2017	9t	02.06.2017	Trockenbau
28	EG Maler Decken	06.06.2017	4t	09.06.2017	Malerarbeiten
29	**2. OG**	**06.06.2017**	**28t**	**14.07.2017**	
30	2. OGDecken öffnen, 8 St 30x30, Revi 2 St 40x40, Revi-F30 1 St 40x40	06.06.2017	8t	16.06.2017	Trockenbau
31	2. OG Leitungsverlegung BMA ELT	19.06.2017	5t	23.06.2017	TGA Elektro
32	2. OG Montage Rauchmelder inkl. Inbetriebnahme	26.06.2017	5t	30.06.2017	TGA Elektro
33	2. OG Decken schließen, 8 St 30x30, Revi 2 St 40x40, Revi-F30 1 St 40x40	03.07.2017	5t	07.07.2017	Trockenbau
34	2. OG Maler Decken	10.07.2017	5t	14.07.2017	Malerarbeiten
35	**3. OG**	**10.07.2017**	**25t**	**11.08.2017**	
36	3. OGDecken öffnen, 8 St 30x30, Revi-F30 1 St 40x40	10.07.2017	5t	14.07.2017	Trockenbau
37	3. OG Leitungsverlegung BMA ELT	17.07.2017	5t	21.07.2017	TGA Elektro
38	3. OG Montage Rauchmelder inkl. Inbetriebnahme	24.07.2017	5t	28.07.2017	TGA Elektro
39	3. OG Decken schließen, 8 St 30x30, Revi-F30 1 St 40x40	31.07.2017	5t	04.08.2017	Trockenbau
40	3. OG Maler Decken	07.08.2017	5t	11.08.2017	Malerarbeiten
41	**4. OG**	**07.08.2017**	**25t**	**08.09.2017**	
42	4. OG Decken öffnen, 4 St 30x30, Revi 1 St 40x40, Revi-F30 2 St 40x40	07.08.2017	5t	11.08.2017	Trockenbau
43	3. OG Leitungsverlegung BMA ELT	14.08.2017	5t	18.08.2017	TGA Elektro
44	3. OG Montage Rauchmelder inkl. Inbetriebnahme	21.08.2017	5t	25.08.2017	TGA Elektro
45	3. OG Decken schließen, 4 St 30x30, Revi 1 St 40x40, Revi-F30 2 St 40x40	28.08.2017	5t	01.09.2017	Trockenbau
46	3. OG Maler Decken	04.09.2017	5t	08.09.2017	Malerarbeiten
47	**Abnahme u. Inbetriebnahme BMA**	**11.09.2017**	**10t**	**22.09.2017**	
48	Sachverständigenabnahme	11.09.2017	5t	15.09.2017	TGA Elektro
49	Behördliche Abnahme	18.09.2017	5t	22.09.2017	Bauherr

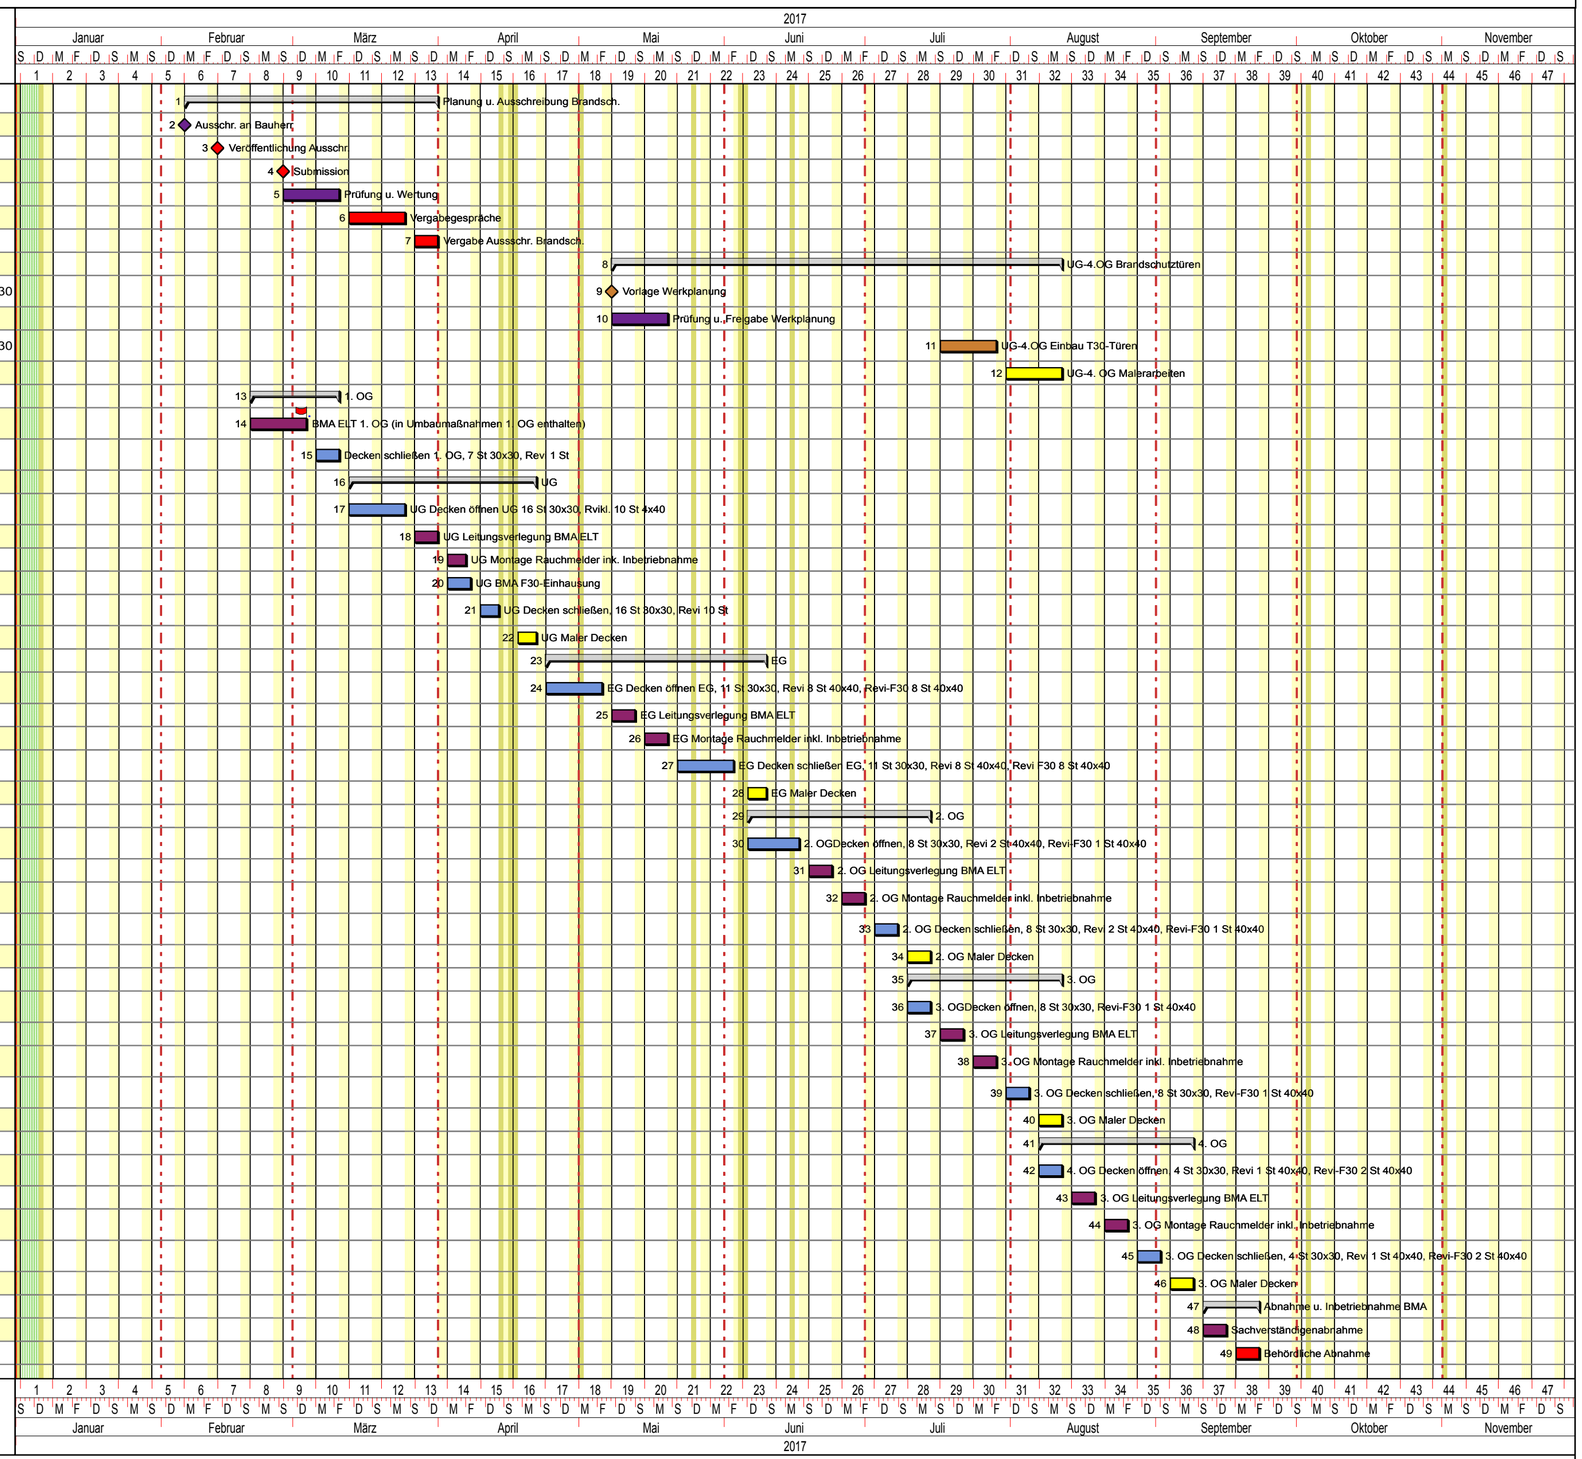

Gewerk

J+G | Bauherr | Metallbauarbeiten T30 | Malerarbeiten | TGA Elektro | Trockenbau

Plansymbole

Meilenstein | Enddatum oder früher

Projektdatei: K:\projekte\24410KHL\C-Architekt-weiss\C3_Arbeitsergebnisse\Termine\UG\161017_Rahmenterminplan UG.pp

Asta Easyplan / Asta Powerproject / Asta Teamplan

Anlage 3 zu 0175 2016 Terminplan
