


# LANDKREIS RAVENSBURG BÜNDELUNG DER LANDKREISVERWALTUNG RAVENSBURG UND WEINGARTEN

## Zeitliche Alternativen der Umsetzungsschritte

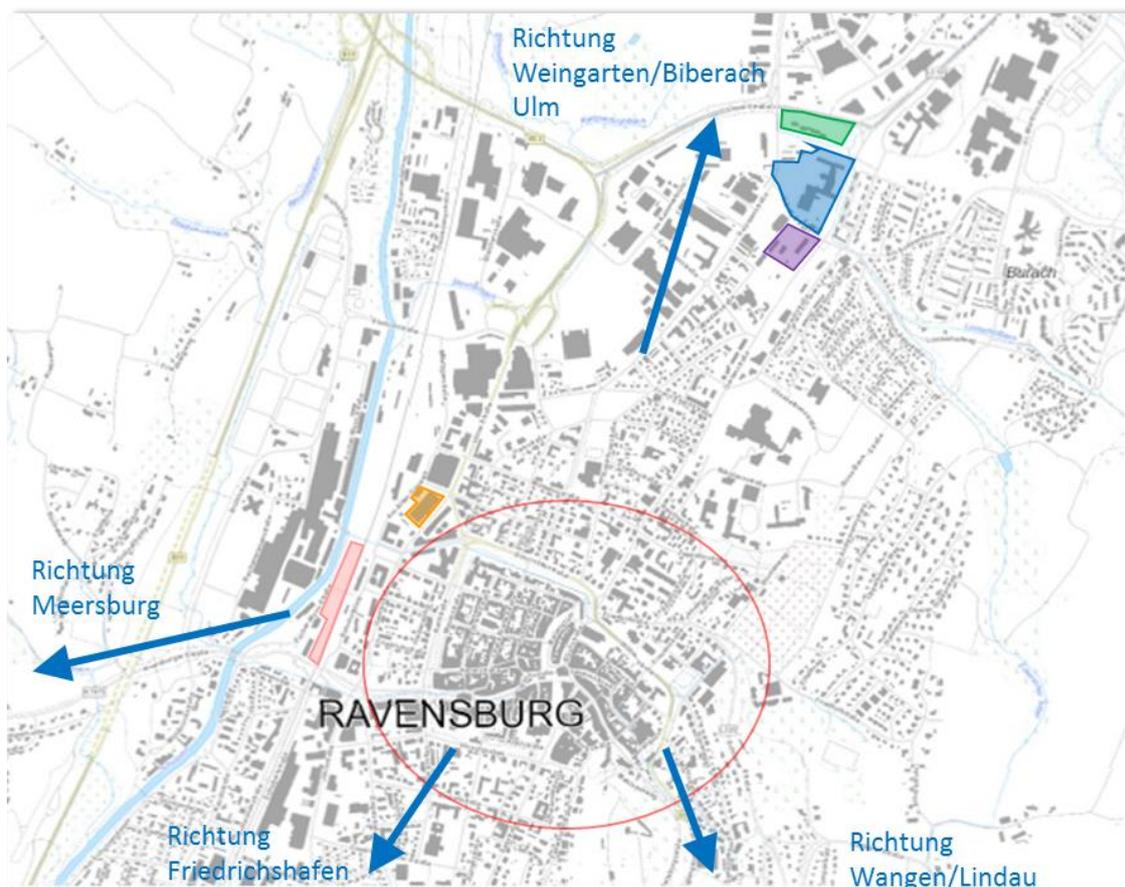

Stand: April 2020

Drees & Sommer  
Obere Waldplätze 13  
70569 Stuttgart

Tel. +49 711 1317-160  
Fax +49 711 1317-40160

---

ANLAGEN

---

## ZEITLICHE ALTERNATIVEN DER UMSETZUNGSSCHRITTE

- Die Abwicklungsmodellen je Variante stellen den Projektablauf sowie die Projektkosten im Mittelabfluss dar.
- Zeitliche Alternativen der Projektabläufe sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich, haben aber Auswirkungen auf den Mittelabfluss. Die möglichen zeitlichen Alternativen werden je Variante mit den dazugehörigen Investitionskosten vergleichend dargestellt.
- Vgl. Beschlussvorlage 0030/2020/Projektgruppe Flächen- u. Standortkonzept S. 14;19;23

ANLAGEN

1-STANDORT VARIANTE

Zeitliches Abwicklungsmodell


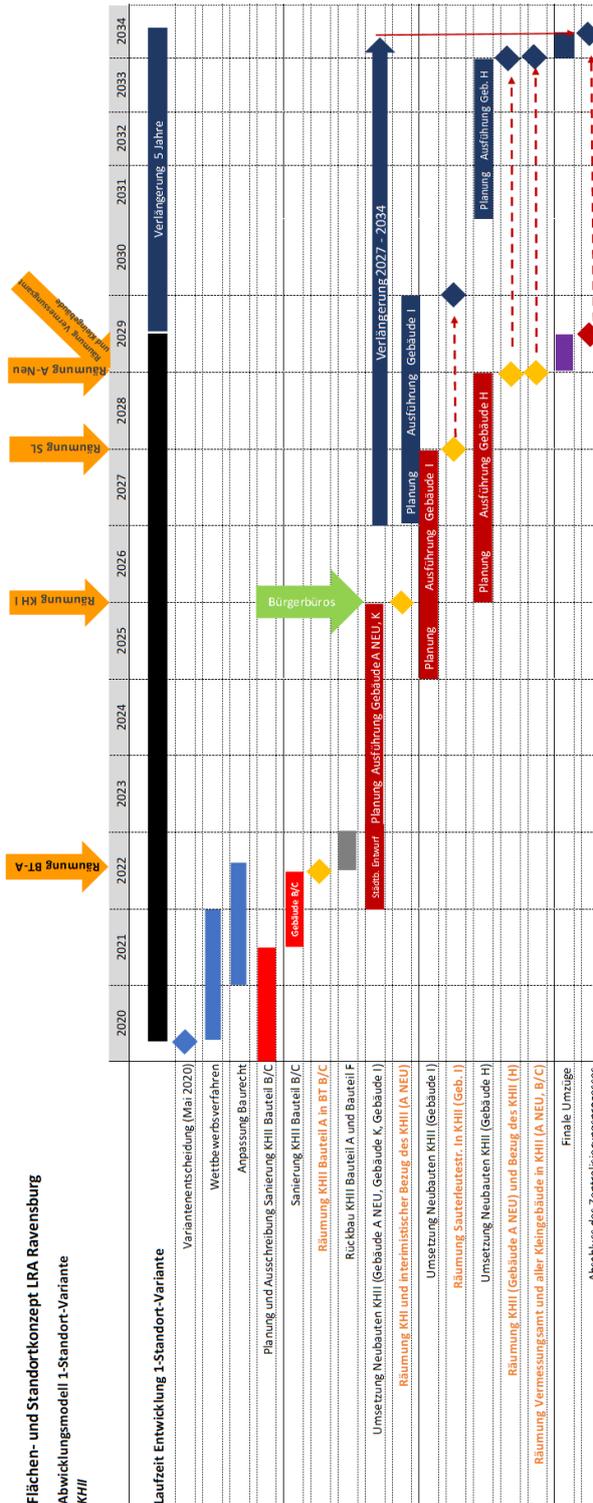


Abb.: Zeitliches Abwicklungsmodell 1-Standortvariante

ANLAGEN


Mittelabfluss

Zeitliche Abwicklung – Projektabschluss 2029

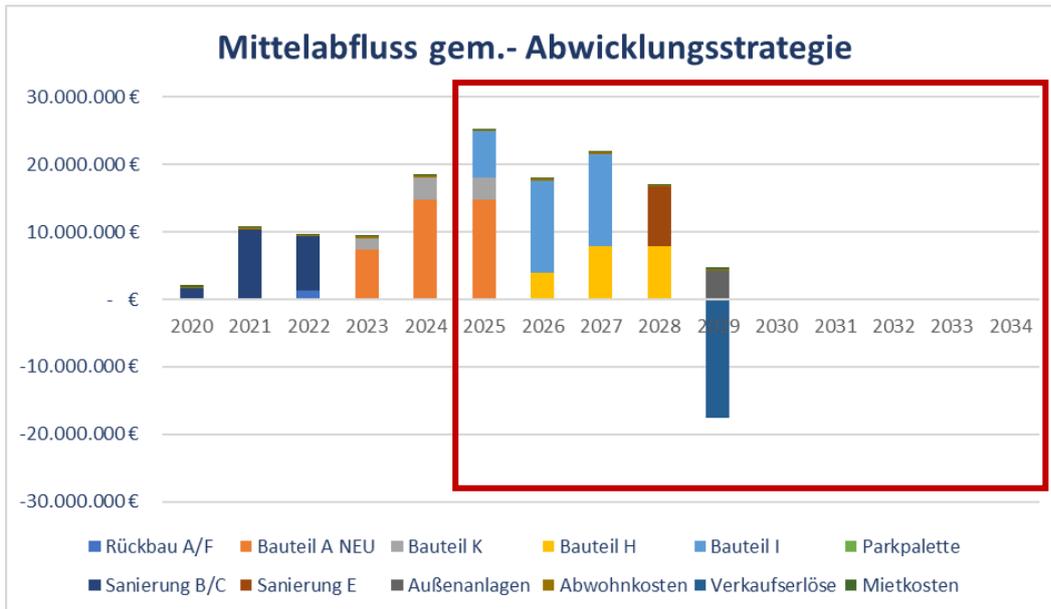

Gesamtsumme: 120 Mio. € brutto

Zeitliche Verzögerung ab 2026 – 2034 (5 Jahre Verlängerung)

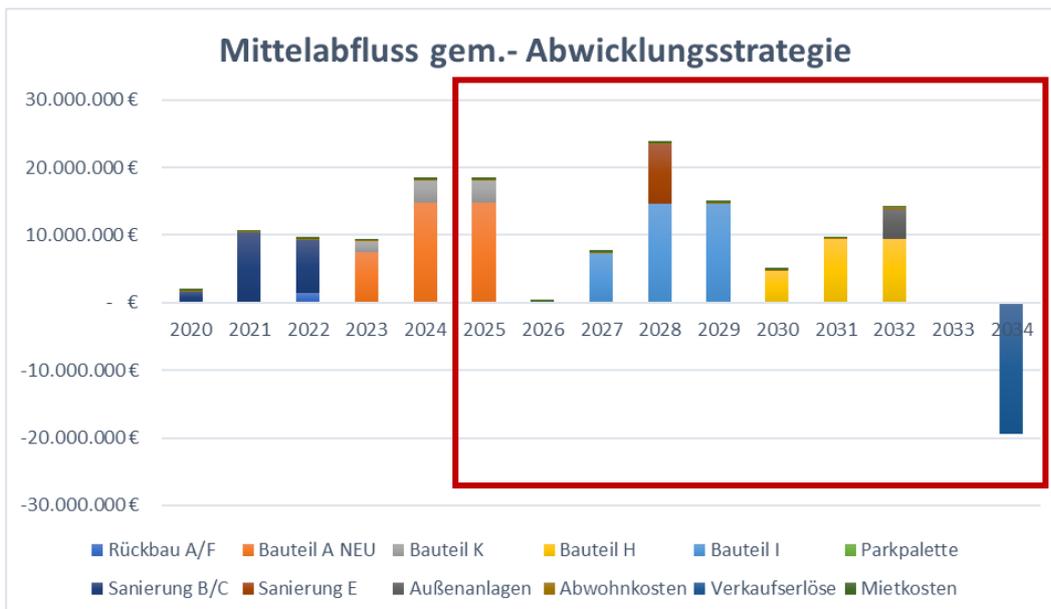

Gesamtsumme: 126 Mio. € brutto

Zu erwartende Mehrkosten

Summe brutto Mehrkosten: ca. 6 Mio. €


Summe gesamt brutto: ca. 126 Mio. €



ANLAGEN


Mittelabfluss

Zeitliche Abwicklung – Projektabschluss Ende 2028

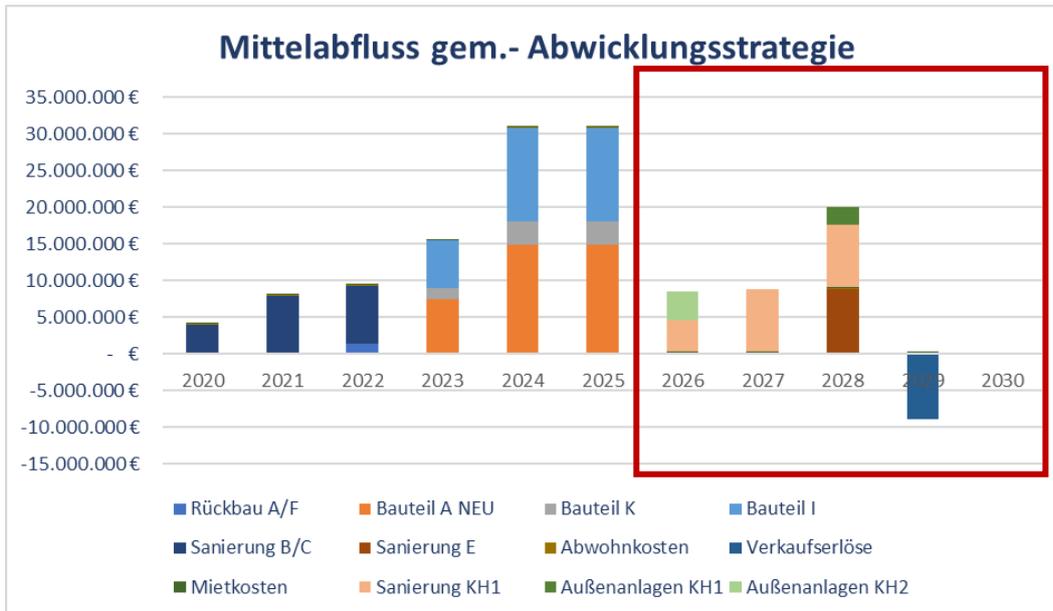

Gesamtsumme: 129 Mio. € brutto

Zeitliche Verzögerung ab 2026 – 2030 (1 Jahre Verlängerung)

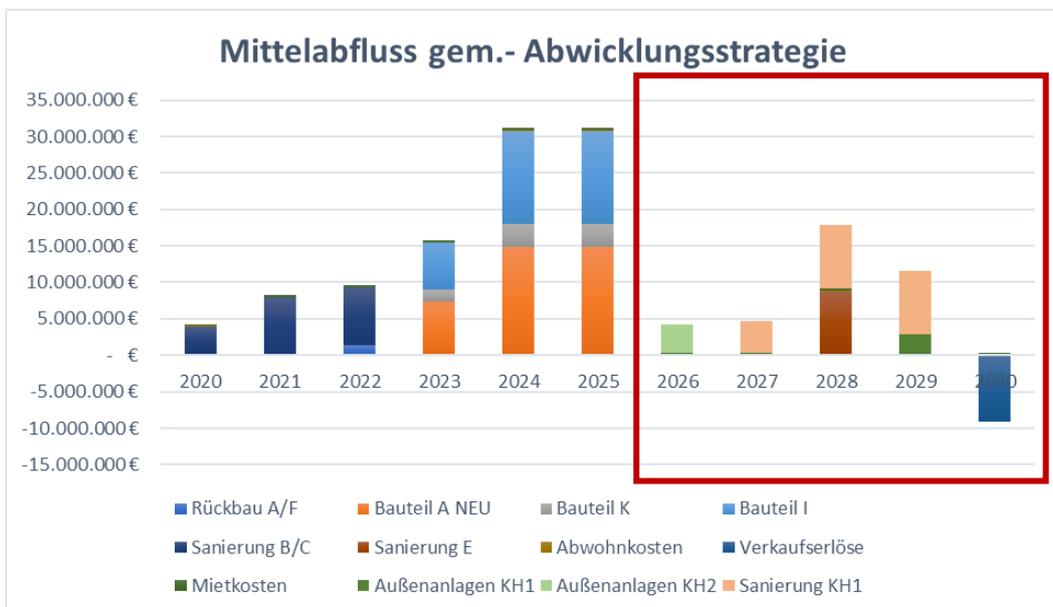

Gesamtsumme: 130 Mio. € brutto

Zu erwartende Mehrkosten

Summe brutto Mehrkosten: ca. 1,1 Mio. €

Summe gesamt brutto: ca. 130 Mio. €

ANLAGEN

4-STANDORTVARIANTE

Zeitliches Abwicklungsmodell


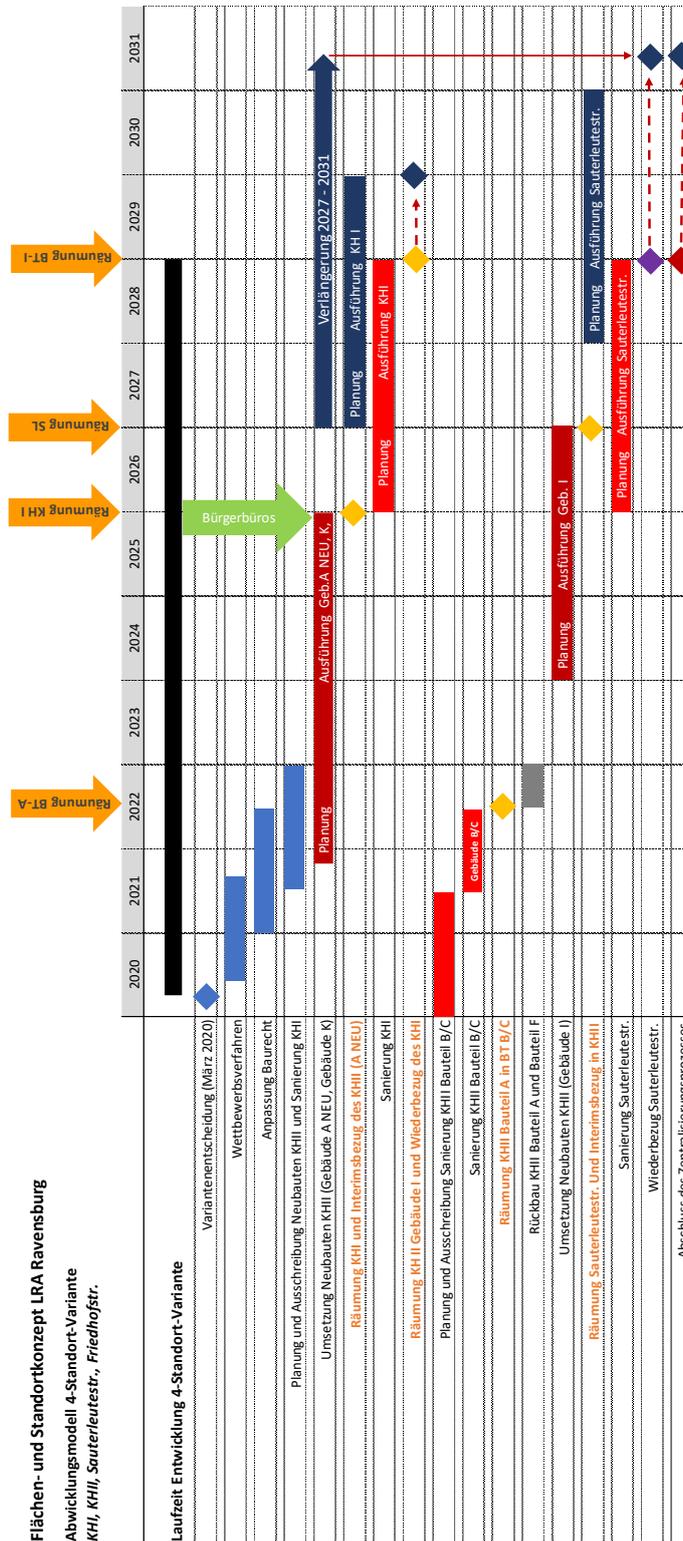


Abb. : Zeitliches Abwicklungsmodell 4

ANLAGEN

Mittelabfluss

Zeitliche Abwicklung – Projektabschluss Ende 2028

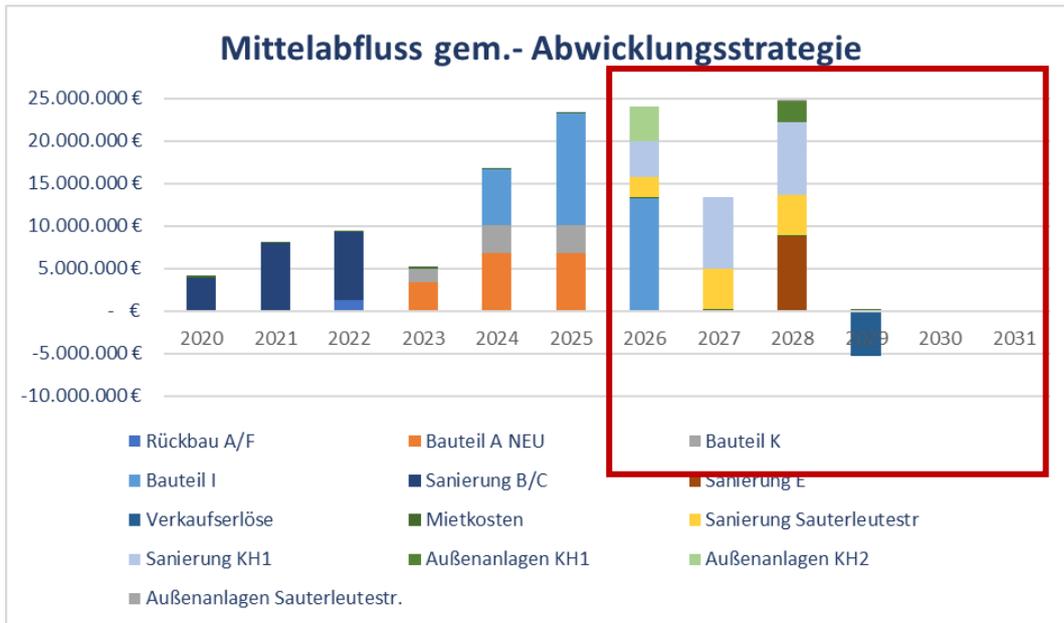

Gesamtsumme: 124 Mio. € brutto

Zeitliche Verzögerung ab 2026 – 2031 (3 Jahre Verlängerung)



Gesamtsumme: 126,2 Mio. € brutto

Zu erwartende Mehrkosten

Summe brutto Mehrkosten: ca. 2,1 Mio. €

Summe gesamt brutto: ca. 126,3 Mio. €
