Behörden- und Gesundheitszentrum Leutkirch Umbau 2. OG zu Hospiz

Zeile-Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Gewerk
	Umbau 1. OG / UG				
1	Fertigstellung 1. OG Neubau	16.12.2016		16.12.2016	IKP
2	Fertigstellung 1. OG Altbau	27.03.2017		27.03.2017	IKP
3	Evtl. Eingriffe in 1. OG	27.12.2017	27t	02.02.2018	J+G
4	Beginn Umbau UG	09.01.2017		09.01.2017	IKP
5	Fertigstellung Umbau UG	22.09.2017		22.09.2017	IKP
6	**Umbau 2. OG Planung/Ausschreibung**	**26.10.2016**	**10m 1,6w**	**08.09.2017**	
7	Raum- und Funktionsprogramm	26.10.2016		26.10.2016	SES
8	Ortsbegehung	07.11.2016	1w	11.11.2016	
9	Workshop	28.11.2016	1w	02.12.2016	
10	IKP-Ausschuss	30.11.2016		30.11.2016	IKP
11	Entscheid Kreistagssitzung	14.12.2016		14.12.2016	IKP
12	Freigabe Planung / Kosten	14.12.2016		14.12.2016	IKP
13	Planungsauftrag	09.01.2017	5t	13.01.2017	IKP
14	Vorlage definitives Raum- u. Funktionsprogramm	06.02.2017		06.02.2017	SES
15	Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	16.01.2017	3m 4t	13.04.2017	J+G
16	Freigabe Entwurfsplanung	18.04.2017		18.04.2017	SES
17	Freigabe Entwurfsplanung	18.04.2017		18.04.2017	IKP
18	Bearbeitung Baugesuch	18.04.2017	1w 4t	28.04.2017	J+G
19	Genehmigungszeit Baugesuch	02.05.2017	2m	29.06.2017	
20	Ausführungsplanung / Ausschreibungen	02.05.2017	4m 2,2w	08.09.2017	J+G
21	**Umbau 2. OG Vergabe**	**11.09.2017**	**2m 1,6w**	**17.11.2017**	
22	**Umbau 2. OG Bauzeit**	**05.12.2017**	**7m**	**29.06.2018**	**J+G**
23	Übergabe Nutzer	02.07.2018		02.07.2018	IKP

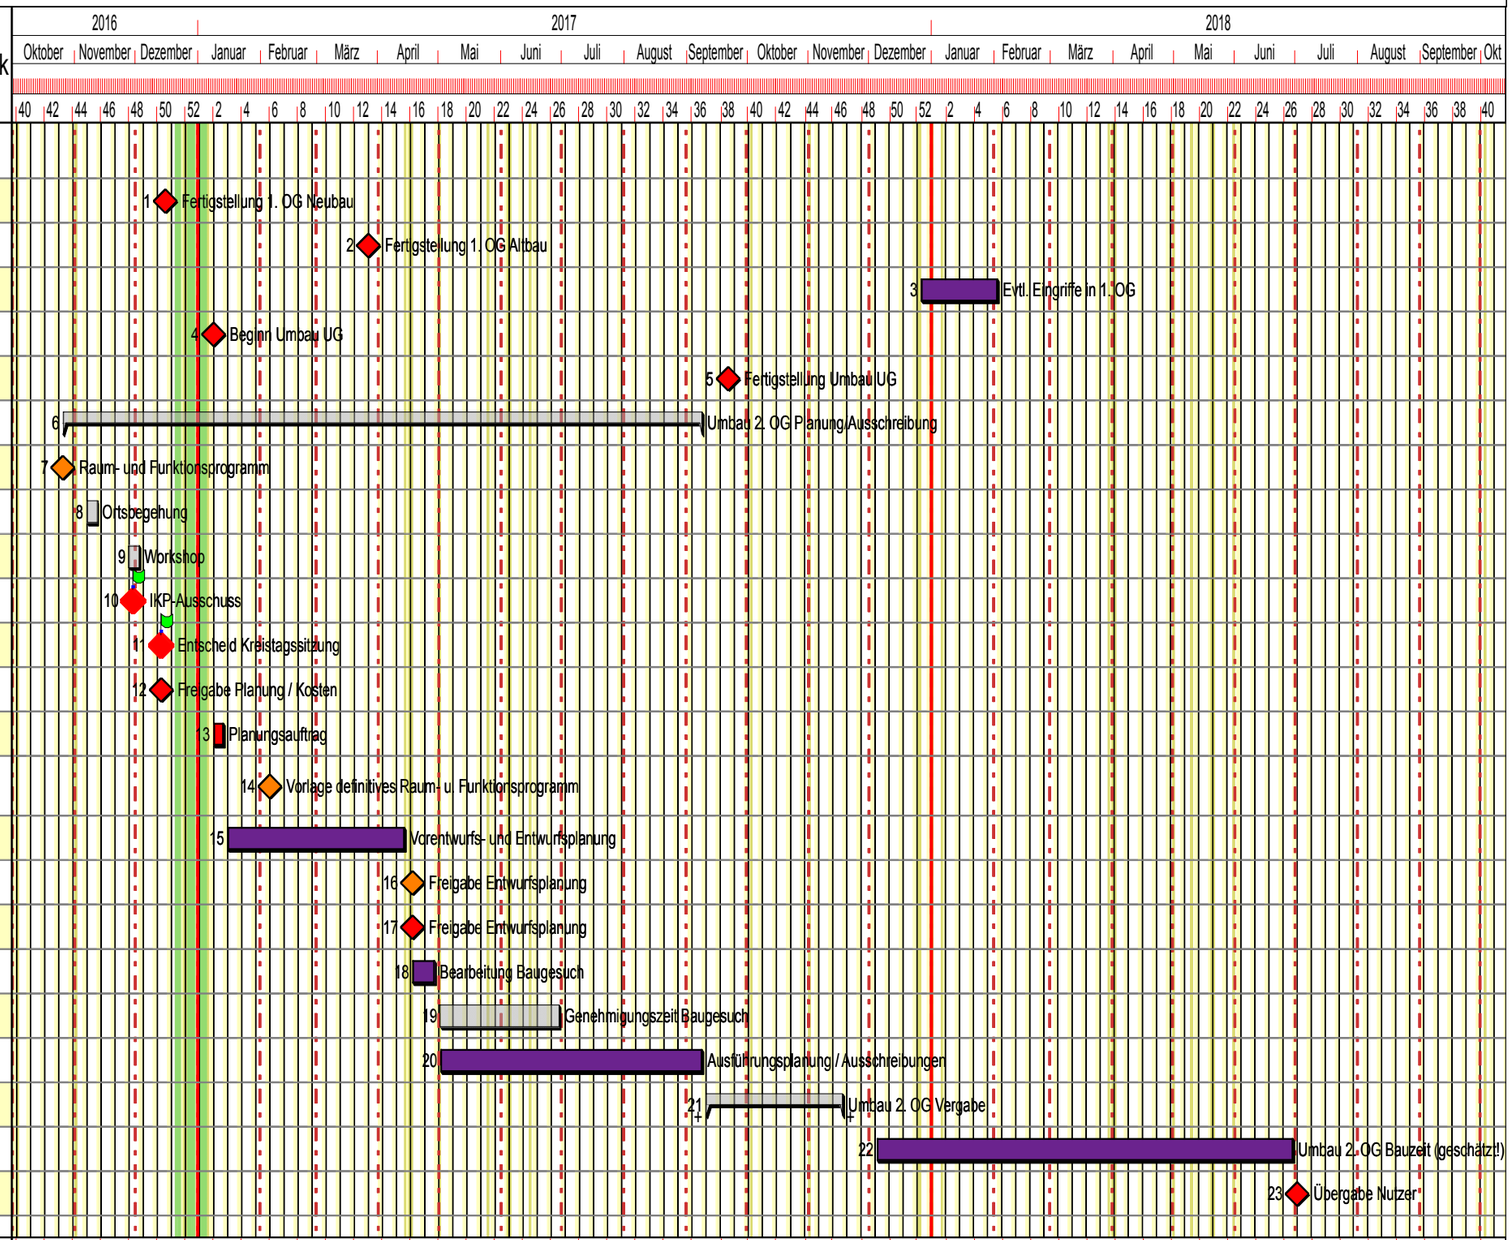

Gewerk

IKP J+G SES

Plansymbole

Meilenstein Kritisch Startdatum

Projektdatei: K:\projekte\24410KHL\C-Architekt-weiss\C3_Arbeitsergebnisse\Termine\161026_Rahmenterminplan 2OG-Hospiz.pp

Anlage 2 zur 0184 2016 Terminplan
