Anlage 4 zu 0123/2017
Terminplan

Westallgäu Klinikum Wangen – MRT, EG

Zeile-Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Gewerk
1	**Hauptplan**	**11.09.2017**	**199t**	**02.07.2018**	
2	IKP-Ausschuss	11.09.2017		11.09.2017	Bauherr
3	Erstellung Baugesuch	11.09.2017	15t	29.09.2017	J+G
4	Laufzeit Baugesuch	02.10.2017	38t	24.11.2017	
5	Ausführungsplanung	18.09.2017	33t	03.11.2017	J+G
6	Ausschreibung	02.10.2017	23t	03.11.2017	J+G
7	Angebotsfrist	06.11.2017	15t	24.11.2017	Bauherr
8	Submission	27.11.2017		27.11.2017	Bauherr
9	Prüfung u. Wertung	27.11.2017	10t	08.12.2017	J+G
10	Vergabe	11.12.2017	10t	22.12.2017	Bauherr
11	Bauzeit	27.12.2017	93t	11.05.2018	J+G
12	Abnahmen, Mängel, Restleistungen	14.05.2018	12t	30.05.2018	
13	Inbetriebnahme	01.06.2018	21t	29.06.2018	
14	Betriebsfertig	02.07.2018		02.07.2018	

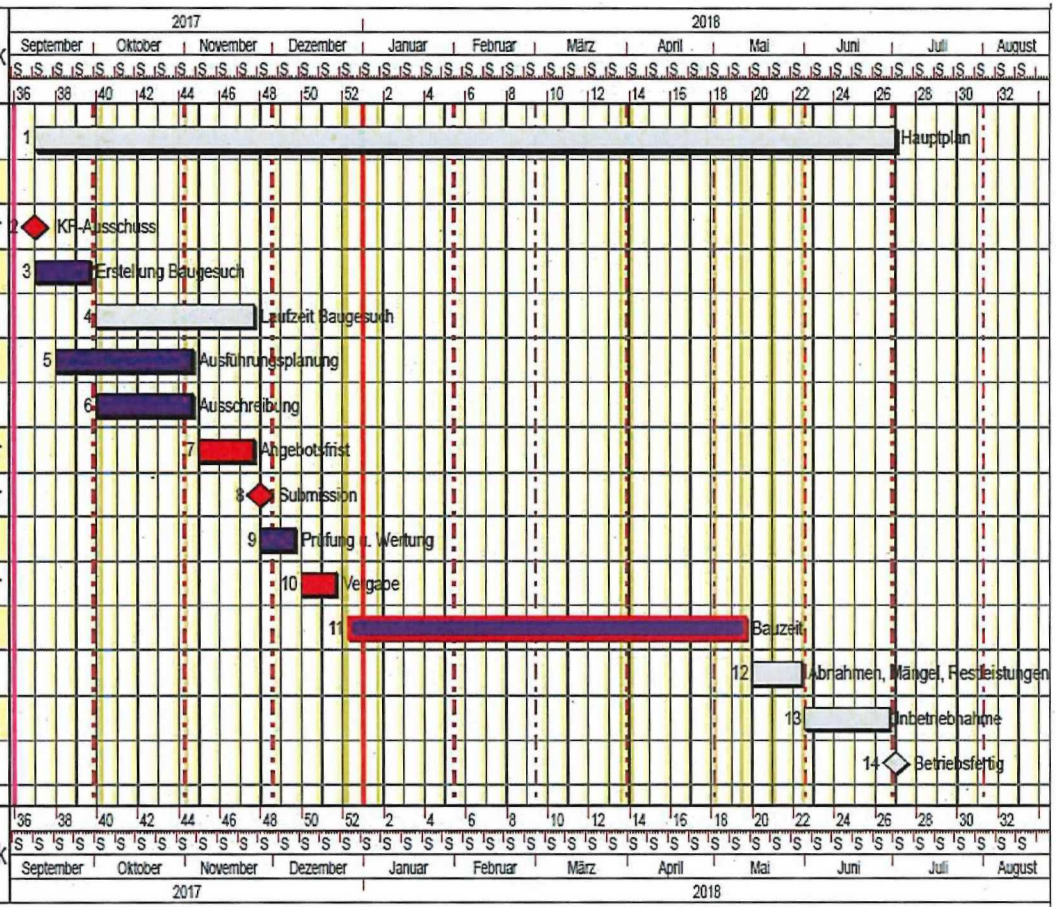

Gewerk

Bauherr J+G

Plansymbole

Meilenstein Kritisch Startdatum oder später

Projektdatei: K:\projekte\23730IKP_MRT\C-Architekt-weiss\C3_Arbeitsergebnisse\Termine\170816_Grobterminplan_aktuell.pp

Asta Eacyplan / Asta Powerproject / Asta Teamplan
