Anlage 4 zu 0130/2017

Terminplan

- Einbau Hospiz-
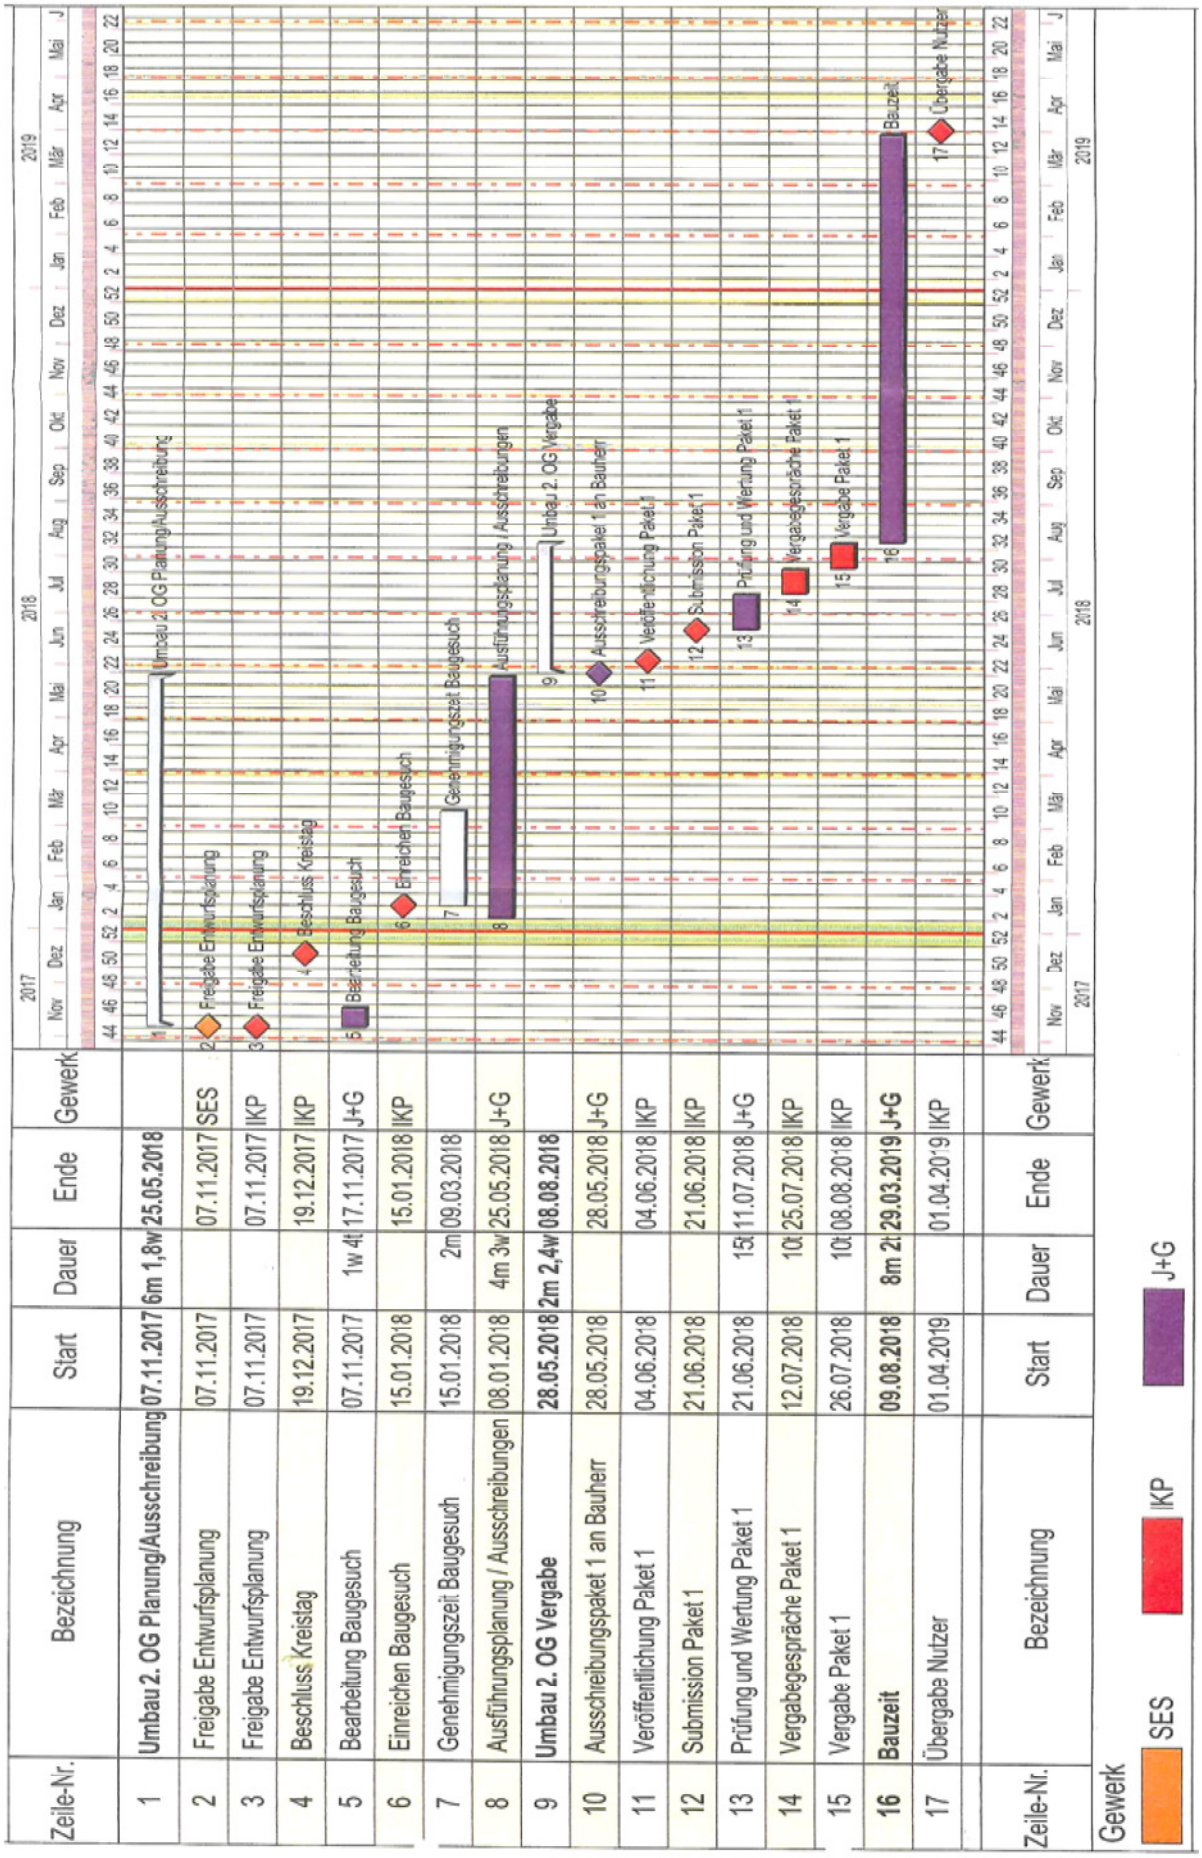
Zeile-Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Gewerk
1	**Umbau 2. OG Planung/Ausschreibung**	07.11.2017	6m 1,8w	25.05.2018	
2	Freigabe Entwurfsplanung	07.11.2017		07.11.2017	SES
3	Freigabe Entwurfsplanung	07.11.2017		07.11.2017	IKP
4	Beschluss Kreistag	19.12.2017		19.12.2017	IKP
5	Bearbeitung Baugesuch	07.11.2017	1w 4t	17.11.2017	J+G
6	Einreichen Baugesuch	15.01.2018		15.01.2018	IKP
7	Genehmigungszeit Baugesuch	15.01.2018	2m	09.03.2018	
8	Ausführungsplanung / Ausschreibungen	08.01.2018	4m 3w	25.05.2018	J+G
9	**Umbau 2. OG Vergabe**	28.05.2018	2m 2,4w	08.08.2018	
10	Ausschreibungspaket 1 an Bauherr	28.05.2018		28.05.2018	J+G
11	Veröffentlichung Paket 1	04.06.2018		04.06.2018	IKP
12	Submission Paket 1	21.06.2018		21.06.2018	IKP
13	Prüfung und Wertung Paket 1	21.06.2018	15t	11.07.2018	J+G
14	Vergabegespräche Paket 1	12.07.2018	10t	25.07.2018	IKP
15	Vergabe Paket 1	26.07.2018	10t	08.08.2018	IKP
16	**Bauzeit**	**09.08.2018**	**8m 2t**	**29.03.2019**	**J+G**
17	Übergabe Nutzer	01.04.2019		01.04.2019	IKP
