Fischerhaus Einbau Dauerausstellung
Bauernhaus-Museum, Wolfegg

Landkreis Ravensburg
Eigenbetrieb IKP

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	Projektstart	0 Tage	Mon 25.02.19	Mon 25.02.19
3	**Planung**	**130 Tage**	**Mon 25.02.19**	**Fre 23.08.19**
4	Lph1 - Grundlagenermittlung	7 Wochen	Mon 25.02.19	Fre 12.04.19
5	**Lph2 - Vorplanung**	**35 Tage**	**Mon 15.04.19**	**Fre 31.05.19**
6	Vorplanung mit Kostensch. ARC	35 Tage	Mon 15.04.19	Fre 31.05.19
7	Vorlage Kostensch. ARC	0 Tage	Fre 31.05.19	Fre 31.05.19
8	Vorlage Kostensch. ELT	0 Tage	Fre 31.05.19	Fre 31.05.19
9	**Lph3 - Entwurfsplanung**	**25 Tage**	**Mon 27.05.19**	**Fre 28.06.19**
10	Entwurfsplanung m. Kostenber.	25 Tage	Mon 27.05.19	Fre 28.06.19
11	Vorlage Kostenberechnung	0 Tage	Mon 24.06.19	Mon 24.06.19
12	**Lph4 - Genehmigungsplanung**	**45 Tage**	**Mon 24.06.19**	**Fre 23.08.19**
13	Genehmigungsplanung	15 Tage	Mon 24.06.19	Fre 12.07.19
14	Baugenehmigung	6 Wochen	Mon 15.07.19	Fre 23.08.19
15	Lph5 - Ausführungsplanung	6 Wochen	Mon 08.07.19	Fre 16.08.19
16	**Gremium**	**19 Tage**	**Mit 29.05.19**	**Die 25.06.19**
17	Anmeldung Gremium	19 Tage	Mit 29.05.19	Mon 24.06.19
18	Abgabe Schriftteil (vormittag)	0 Tage	Mit 12.06.19	Mit 12.06.19
19	Sitzungstermin Kulturausschuss	0 Tage	Die 25.06.19	Die 25.06.19
20	**Lph6+7 Vergabe**	**54 Tage**	**Mon 15.07.19**	**Son 22.09.19**
21	Lph6+7 - Vorber. und Mitwirk. der Vergabe	3 Wochen	Mon 15.07.19	Fre 02.08.19
22	Ausschreibung	4 Wochen	Mon 05.08.19	Fre 30.08.19
23	Submission	0 Tage	Fre 30.08.19	Fre 30.08.19
24	Bindefrist	20 Tage	Fre 30.08.19	Son 22.09.19
25	Auswertung der Angebote	2 Wochen	Fre 30.08.19	Die 10.09.19
26	Auftrags-Vergabe	2 Wochen	Mit 11.09.19	Son 22.09.19
27	**Lph8 Ausführung**	**149 Tage**	**Mon 23.09.19**	**Don 16.04.20**
28	Arbeitsvorbereitung	34 Tage	Mon 23.09.19	Don 07.11.19
29	Baustelleneinrichtung	1 Woche	Fre 08.11.19	Don 14.11.19
30	Bauausführung	19 Wochen	Fre 15.11.19	Don 26.03.20
31	Abnahme	0 Tage	Don 26.03.20	Don 26.03.20
32	Revisionsunterlagen	4 Wochen	Fre 20.03.20	Don 16.04.20

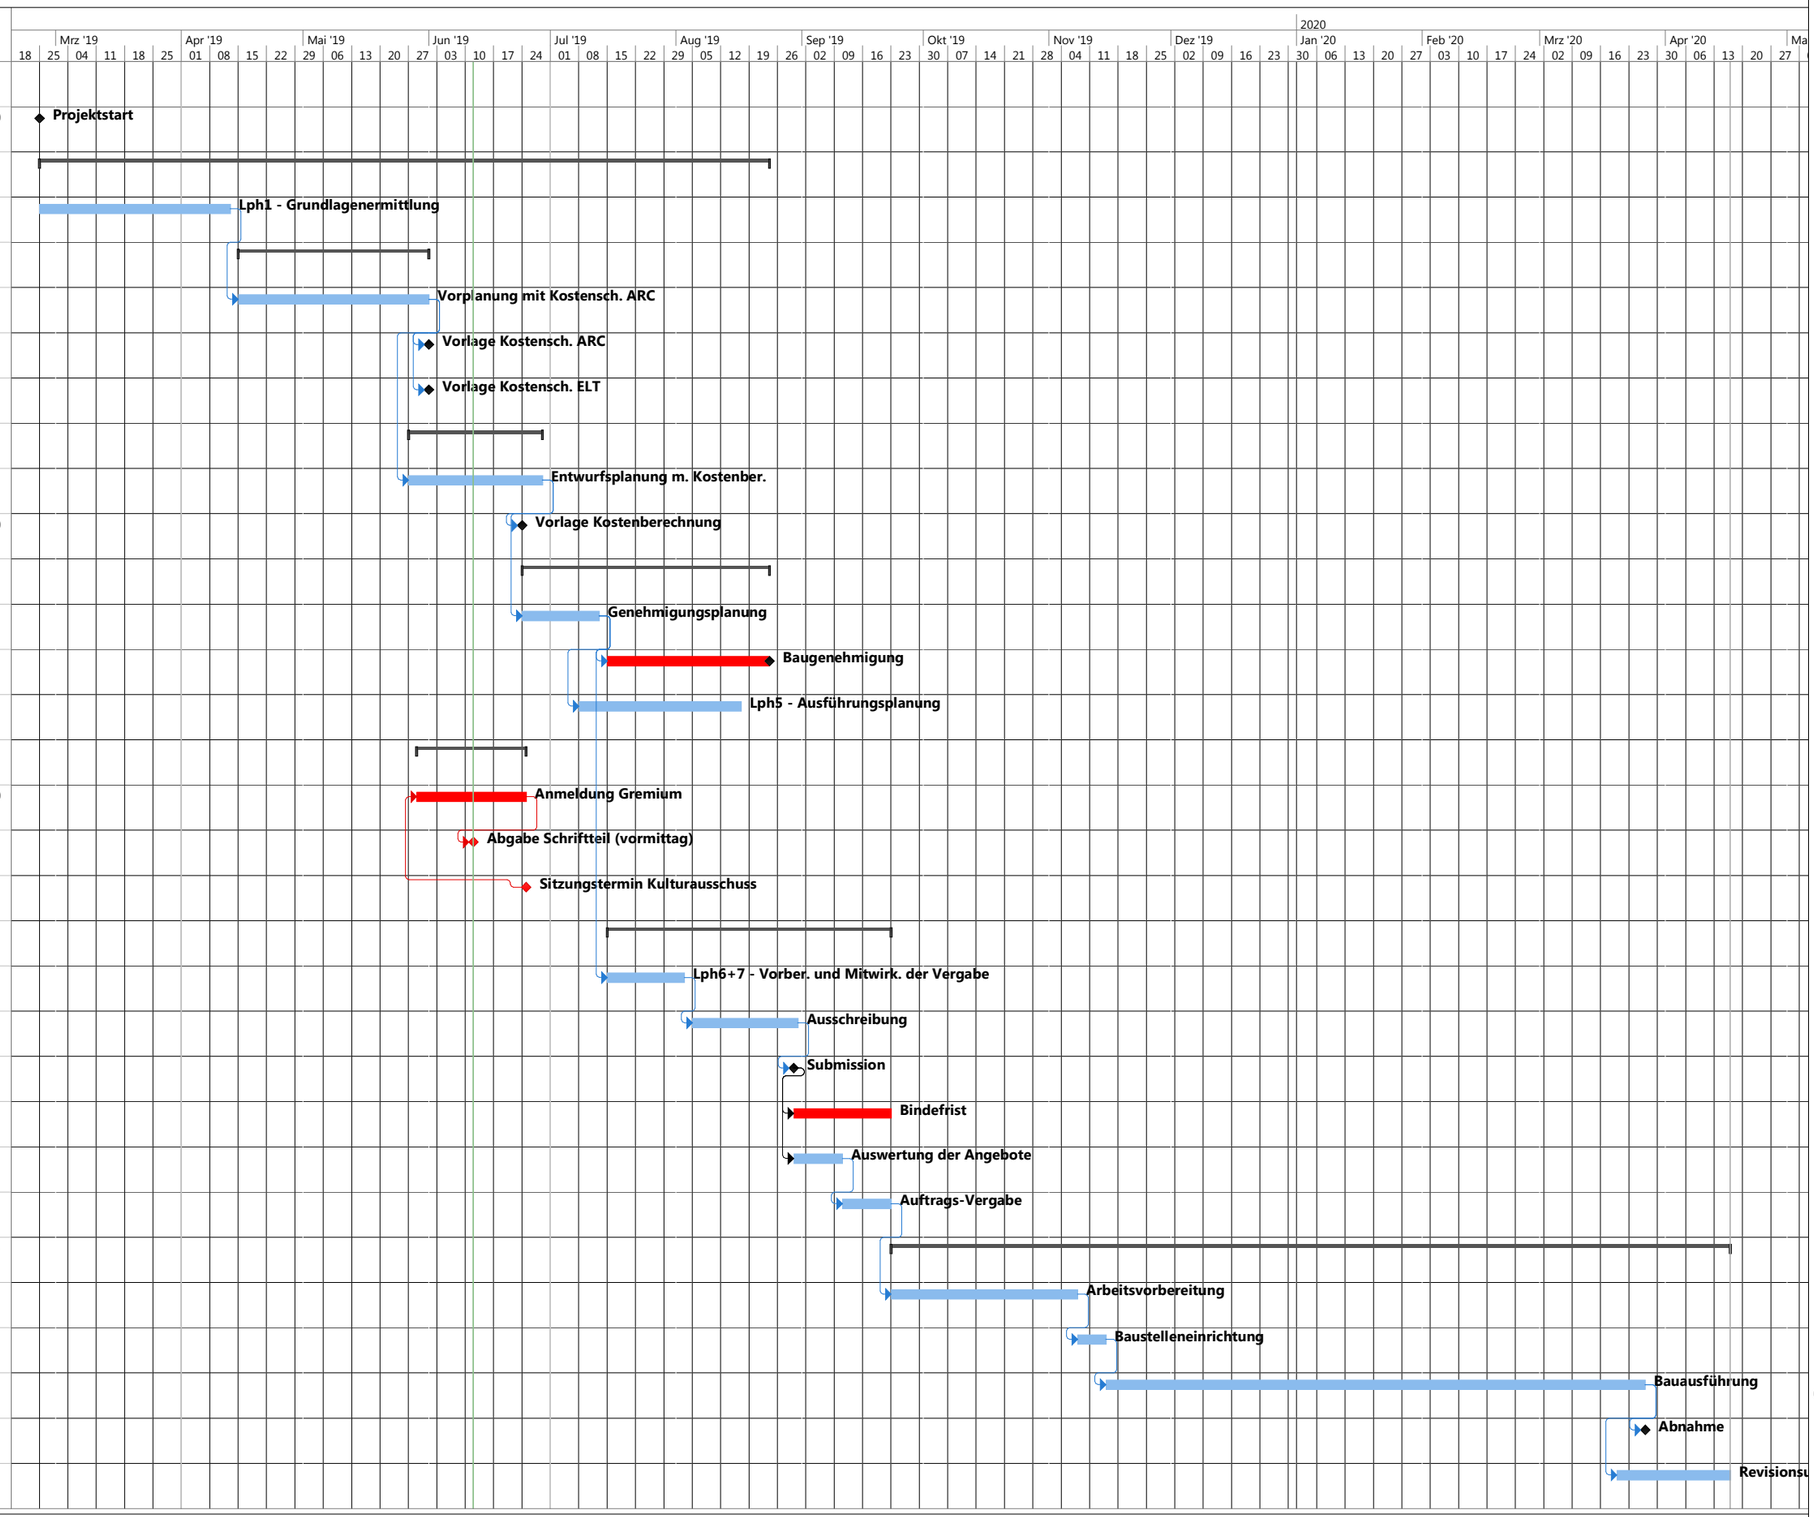

Projektnummer: I817120
Bearbeiter: Christian Brunner

Vorgang — Unterbrechung — Meilenstein ◆ — Sammelvorgang

Anlage 2 zu 0084-2019
